Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3781_UP21Barlad 2_ua 25A%_usc, , Grad de accesibilitate: 251 - 500m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
01.09.2026	3781	2600125302380	XXI Barlad 2	PODISUL MOLDOVEI	POGANA	

Suprafața totală act.	13,00
Tratament	Acc.I
Natura produsului	ACCIDENTALE I
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii	30.08.2026
Anul exploatării	2026
Procedeul de inventariere	Fir cu fir
Ciocan rotund numărul	VN0910
Ciocan pătrat numărul	

Informații privind N.T.S.M.		
Stâncării pe	0	ha
Arbori putregăioși	30	buc
cu un volum de	25,81	mc
Iescării	0	buc
cu un volum de	0	mc

Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Răşinoase	0	0,00
FAG	359	1,51
Quercinee	9	0,71
Diverse tari	50	0,48
Diverse moi	0	0,00
Total	418	1,37

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Fag	36,81	39,18	0	3,6	1,68	0,66	0,02	81,95	4,29	456,8	30,26	543,04
Gorun (S)	0,17	0,59	0	0,17	0,1	0,04	0,01	1,08	0,17	5,17	0,32	6,42
Carpen	0,09	1,39	0	0,59	0,49	0,29	0,19	3,04	0,28	18,82	1,66	22,14
Jugastru	0,07	0,16	0	0,02	0,01	0	0	0,26	0,04	1,67	0,08	1,97
TOTAL	**37,14**	**41,32**	**0**	**4,38**	**2,28**	**0,99**	**0,22**	**86,33**	**4,78**	**482,46**	**32,32**	**573,57**

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
025 A	13,00	110	8.00	65.00	8,45	8Fa2Fr	1	573,57
Total	**13,00**				**8,45**			**573,57**

U.A.	FA	GO.s	CA	JU	Total
025 A	543,04	6,42	22,14	1,97	**573,57**

U.A.	Specia	Diametre		Inaltimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
025 A	FA	44,80	45,00	18,42	18,42	110	1,51	359		36,81	39,18	0	3,6	1,68	0,66	0,02	81,95	4,29	456,8	30,26	543,04
025 A	GO.s	32,67	32,67	12,56	12,56	110	0,71	9		0,17	0,59	0	0,17	0,1	0,04	0,01	1,08	0,17	5,17	0,32	6,42
025 A	CA	25,96	25,85	12,19	12,19	110	0,46	48		0,09	1,39	0	0,59	0,49	0,29	0,19	3,04	0,28	18,82	1,66	22,14
025 A	JU	35,00	35,00	20,00	20,00	110	0,99	2		0,07	0,16	0	0,02	0,01	0	0	0,26	0,04	1,67	0,08	1,97
Total U.A.								**418**	**0**	**37,14**	**41,32**	**0**	**4,38**	**2,28**	**0,99**	**0,22**	**86,33**	**4,78**	**482,4**	**32,32**	**573,57**
Total general U.A.								**418**	**0**	**37,14**	**41,32**	**0**	**4,38**	**2,28**	**0,99**	**0,22**	**86,33**	**4,78**	**482,46**	**32,32**	**573,57**


Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
SILVIU TICU

Verificat,


SCHIȚA PARTIZII

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

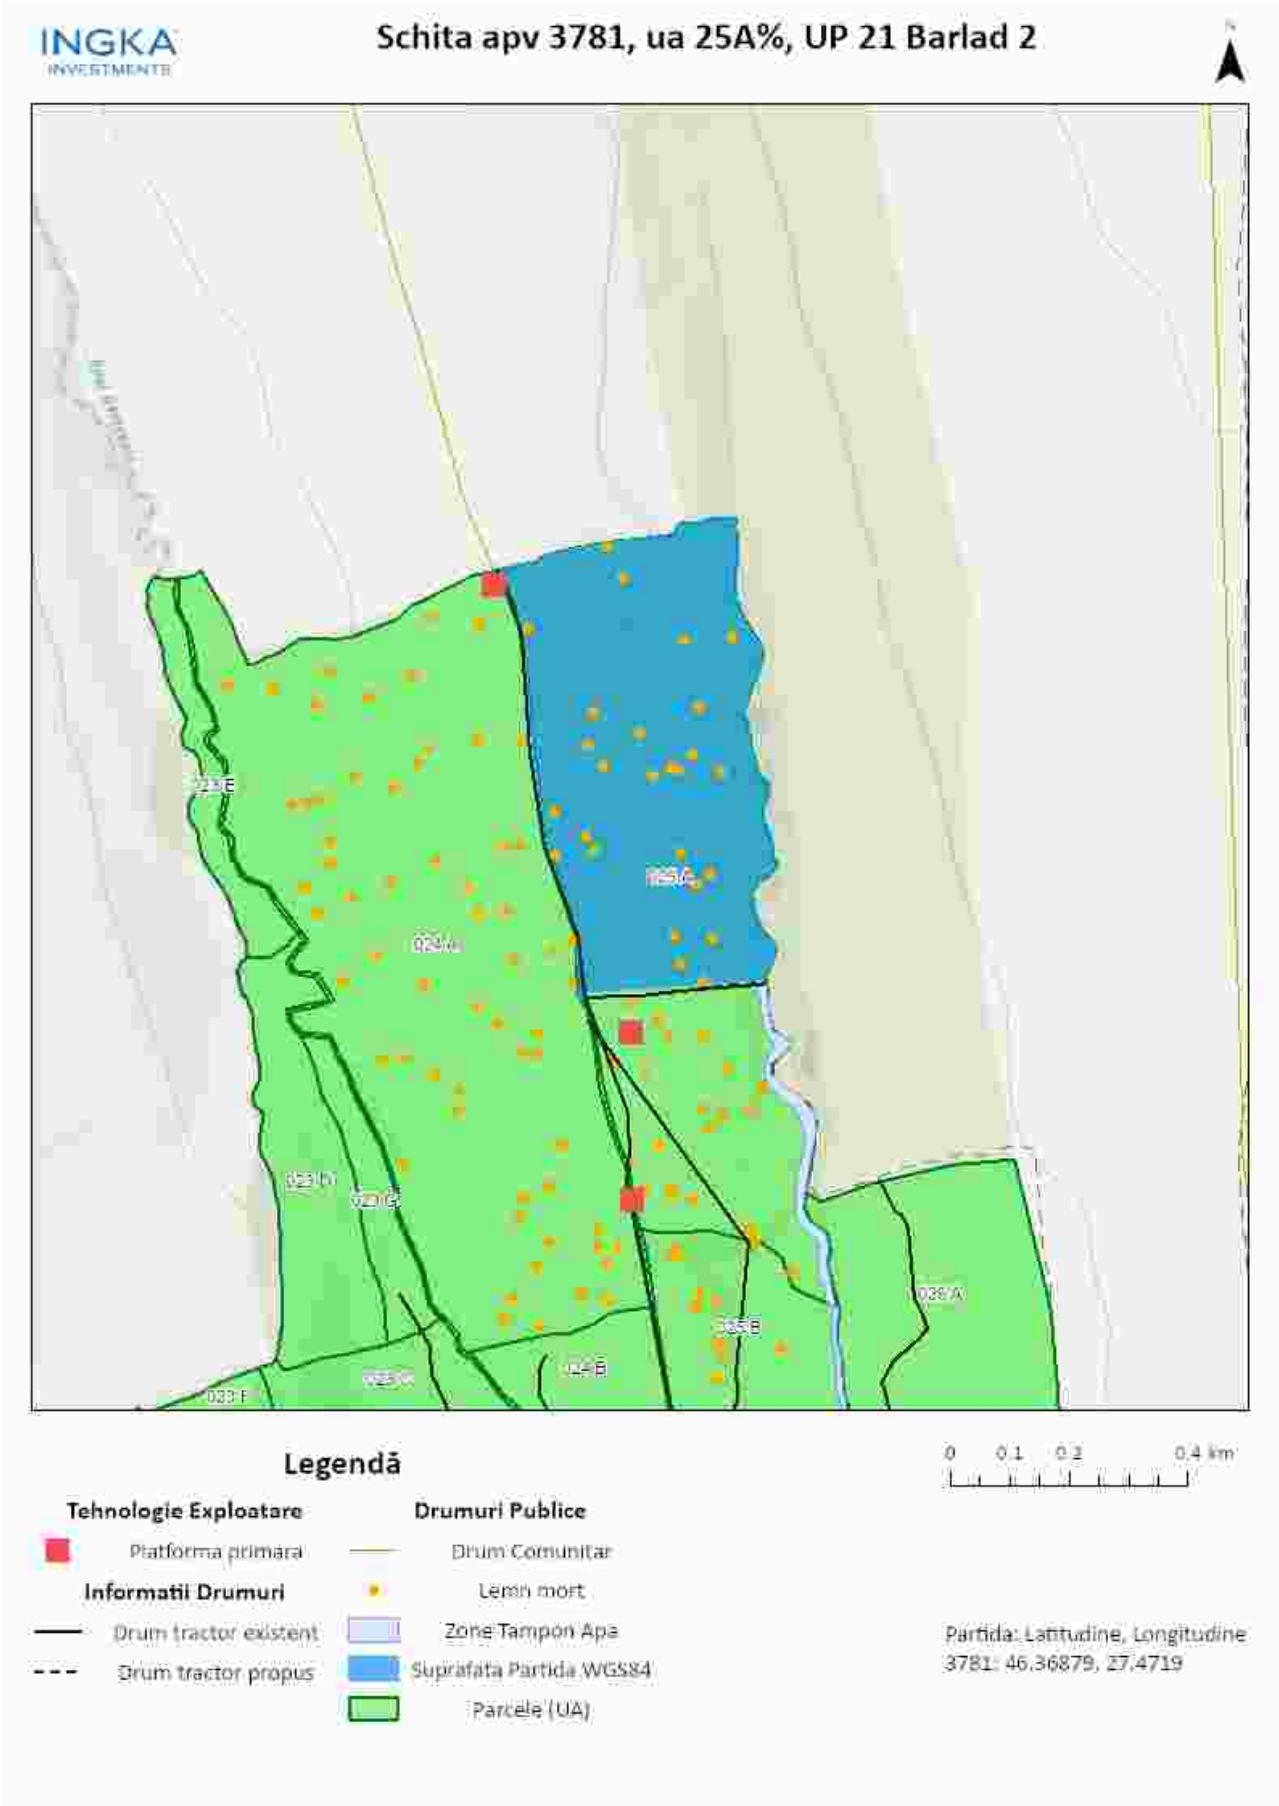

Întocmit: Ing. ADRIAN LUCULESCU

SCHIȚA DE ANSAMBLU

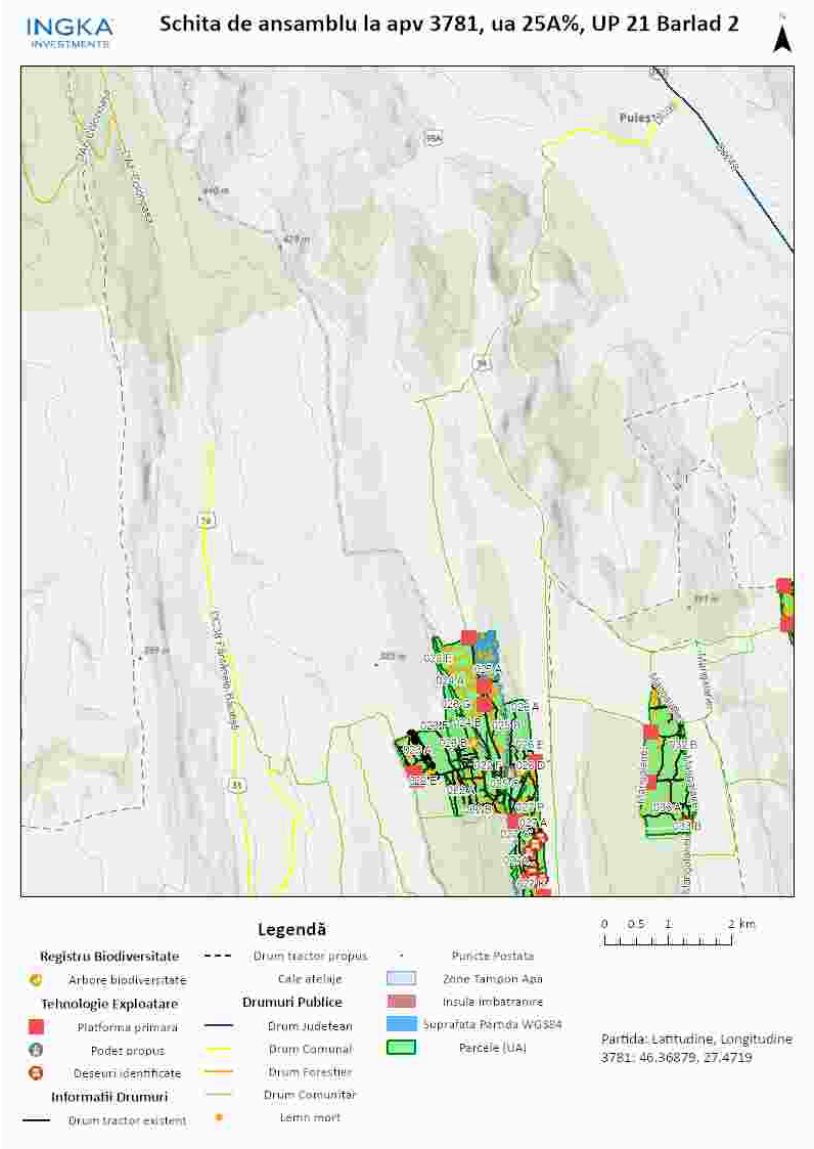

Întocmit: Ing. ADRIAN LUCULESCU

Anexă APV nr. 3781/2600125302380 P3781_UP21Barlad 2_ua 25A%_usc

Localizare: U.P. XXI Barlad 2 u.a. 25 A

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăţi/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operaţiunilor:DA

- obiectiv: Drumuirle de acces sunt drumuri de pamant de servitute agricola.
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: Transportul masei lemnuase se face cand solul este inghetat sau uscat.nu se dererioreaza drumul.
- proceduri de compensare a proprietarilor: Ramane in sarcina cumparatorului masei lemnoase sa ajunga la o intelegere cu administratorul/proprietarul drumurilor

2. Situri cu semnificaţie culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunităţile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: NU

- Denumire pârâu: _____
- lungime sector afectat: _____
- lucrari hidrotehnice _____
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: _____
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): _____
- Suprafaţa zonei tampon _____ ha
- Volumul pe picior din zona tampon _____ mc
- Podeţe de traversare(amplasament, detalii contrucţie): _____
- Restricţionarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): _____
- Alte soluţii tehnice: _____

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:NU / Categoria VRC _____

- Măsuri de management _____

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale **: NU**

Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri **de colectare cu** potențial **de eroziune: DA**

- Măsuri de management: in perioadele cand solul este moale, de la precipitatii/dezghet, nu se intra cu utilaje pe suprafata parchetului sau alte drumuri de tractor.

11. Pe suprafaţa parchetului s-a identificat și materializat:
(i) un număr de _____ arbori pentru biodiversitate mentinuti pe suprafata parchetului, cu un volum total 0 mc
(ii) un număr de "insule de îmbătrânire" delimitate prin - (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

- Suprafața insule imbatranire 0 ha
- Volumul pe picior din insule de imbatranire 0 mc

(iii) un numar de 28 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 19.32 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricţii de rulare _____

- restricţii de tonaj(alte restrictii/observatii): _____ tronson drum: _____ orar: _____

13. Menţiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

In perioadele cu precipitatii sau dezghet nu se va lucra cu utilaje, pe suprafata parchetului. Se vor respecta restrictiile locale de orice fel.

Soluții adoptate: In perioada cu inghet/dezghet sau perioade cu precipitatii, nu se va lucra pe suprafata parchetului cu utilaje.

Resp. marcare Gheorghe Luculescu2 Data: 14.09.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN
