Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3813_UP30_ua3A_Pr Florii, , Grad de accesibilitate: 1001 - 1500m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
28.09.2026	3813	2600125302700	XXX Largu - Hangu	LARGU - HANGU	PETRU VODA	

Suprafața totală act.	7,00
Tratament	TSSM
Natura produsului	PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii	28.09.2026
Anul exploatării	2026
Procedeul de inventariere	Fir cu fir
Ciocan rotund numărul	VN0915
Ciocan pătrat numărul	

Informații privind N.T.S.M.		
Stâncării pe		ha
Arbori putregăioși	0	buc
cu un volum de	0	mc
Iescării	0	buc
cu un volum de	0	mc

Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Răşinoase	1024	1,10
FAG	0	0,00
Quercinee	0	0,00
Diverse tari	0	0,00
Diverse moi	0	0,00
Total	1024	1,10

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	20,78	4,2	1,03	0,85	0,14	0	0,03	27,03	3	0,47	0	30,5
Molid	379,34	325,61	97,2	80,55	26,56	0	8,34	917,6	87,81	86,94	0,07	1092,35
TOTAL	**400,12**	**329,81**	**98,23**	**81,40**	**26,70**	**0**	**8,37**	**944,63**	**90,81**	**87,41**	**0,07**	**1122,85**

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
003 A	7,00	151	25.00	65.00	4,6	8MO2BR	1,2	1122,85
Total	**7,00**				**4,6**			**1122,85**

U.A.	BR	MO	Total
003 A	30,5	092,35	**122,85**

U.A.	Specia	Diametre		Inaltimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
003 A	BR	44,15	44,15	25,85	25,85	151	2,35	13		20,78	4,2	1,03	0,85	0,14	0	0,03	27,03	3	0,47	0	30,5
003 A	MO	31,14	36,74	27,21	27,21	151	1,08	1011		379,34	325,61	97,2	80,55	26,56	0	8,34	917,6	87,81	86,94	0,07	1092,35
Total U.A.								**1024**	**0**	**400,1**	**329,8**	**98,23**	**81,40**	**26,70**	**0**	**8,37**	**944,6**	**90,81**	**87,41**	**0,07**	**1122,85**
Total general U.A.								**1024**	**0**	**400,12**	**329,81**	**98,23**	**81,40**	**26,70**	**0**	**8,37**	**944,63**	**90,81**	**87,41**	**0,07**	**1122,85**


Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
PETREA VASILIU

Verificat,


SCHIȚA PARTIZII

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

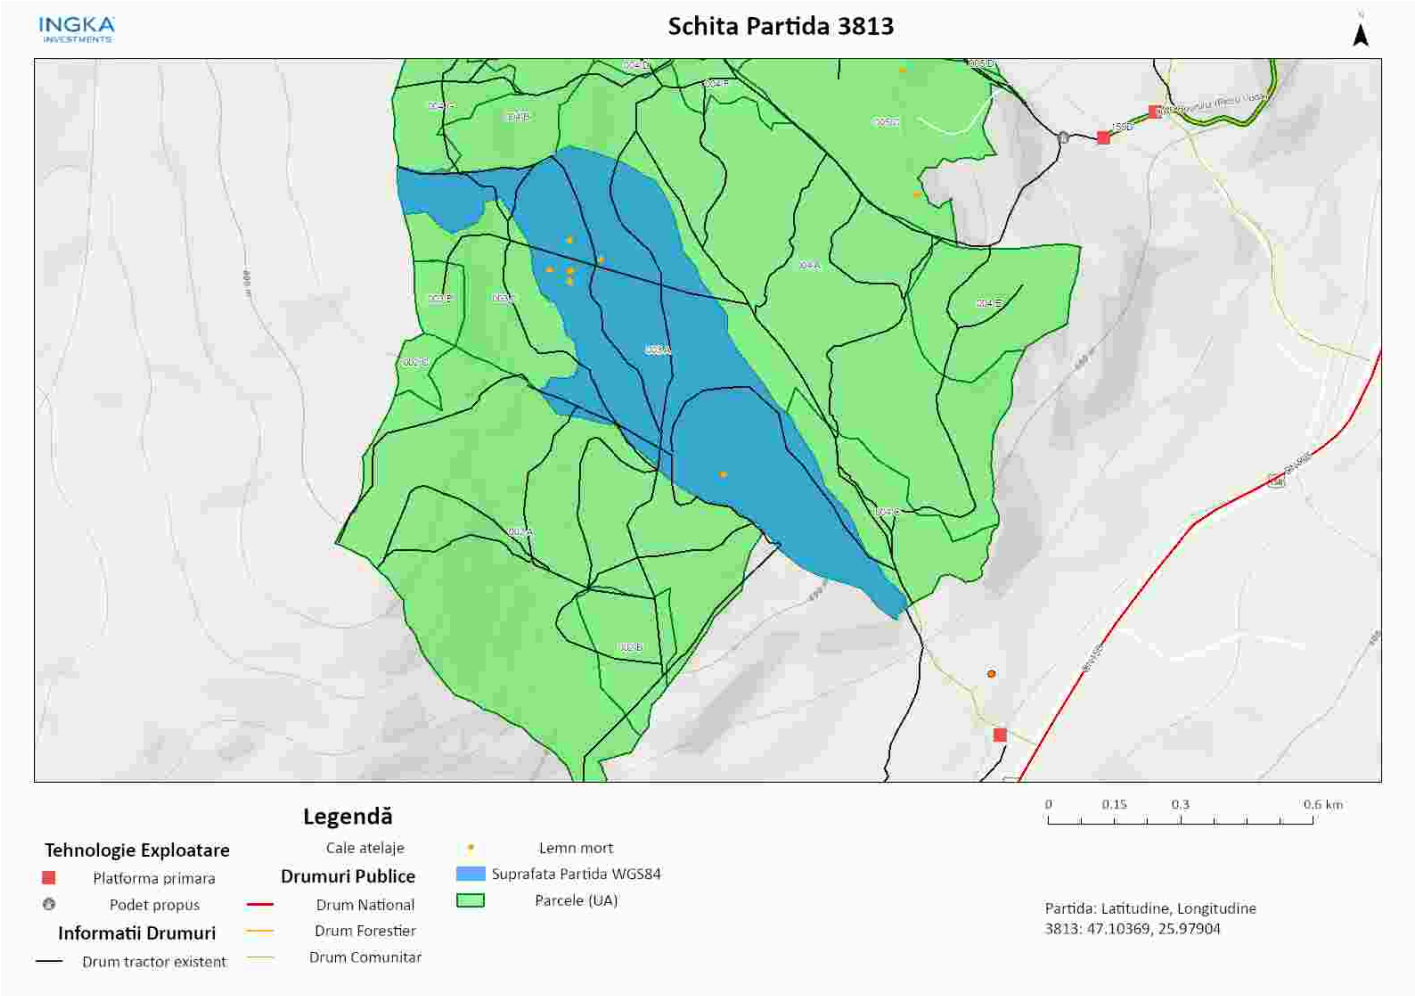

Întocmit: Ing. CIPRIAN BISTRICEANU

SCHIȚA DE ANSAMBLU

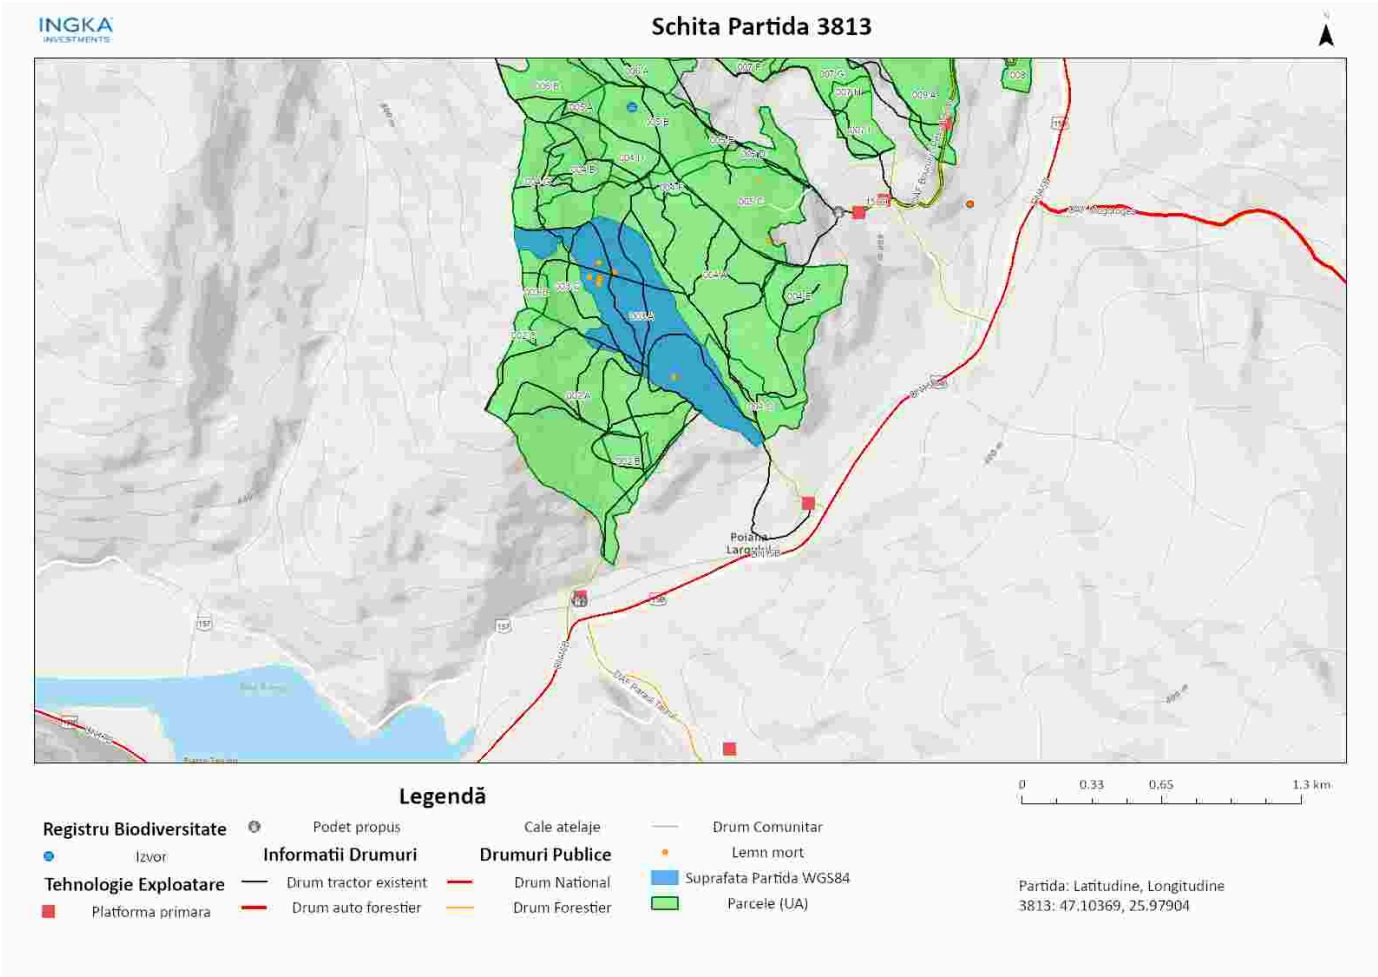

Întocmit: Ing. CIPRIAN BISTRICEANU

Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

Anexă APV nr. 3813/2600125302700 P3813_UP30_ua3A_Pr Florii

Localizare: U.P. XXX Largu - Hangu u.a. 3 A

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăţi/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operaţiunilor:DA

- obiectiv: proprietati particulare-persoane fizice,pasune împadurita priamaria poiana teiului
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: arborii vor fi doborati si fasonati in interiorul padurii-3a
- proceduri de compensare a proprietarilor: intelegerea intre factorul afectat si beneficiarul masei lemnuase.

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: fara nume
- lungime sector afectat: 6
- lucrari hidrotehnice nu
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: Trecerea peste parau se va face pe podet din lemn sau tuburi.
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): 0
- Suprafața zonei tampon 0 ha
- Volumul pe picior din zona tampon 0 mc
- Podeţe de traversare(amplasament, detalii contrucţie): Podet din lemn sau tuburi
- Restricţionarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): Pe timp de ploaie
- Alte soluţii tehnice: _____

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:NU / Categoria VRC _____

- Măsuri de management _____

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale **: NU**

Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri de colectare cu potenţial de eroziune: NU

- Măsuri de management:

11. Pe suprafaţa parchetului s-a identificat și materializat:
(i) un număr de _____ arbori pentru biodiversitate mentinuti pe suprafata parchetului, cu un volum total 0 mc
(ii) un număr de "insule de îmbătrânire" delimitate prin 0 (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

- Suprafața insule imbatranire 0 ha
- Volumul pe picior din insule de imbatranire 0 mc

(iii) un numar de 6 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 6.42 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricţii de rulare _____

- restricţii de tonaj(alte restrictii/observatii): _____ tronson drum: _____ orar: _____

13. Menţiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

0

Soluții adoptate: 0

Resp. marcare Ciprian Bistriceanu Data: 06.10.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN
