Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3849_UP31_ua50_Piciorul Cerbu, , Grad de accesibilitate: 501 - 1000m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
26.10.2026	3849	2600125303060	XXXI Ceahlau - Dreptu	ZAHORNA	ZAHORNA	

Suprafața totală act.	12,91
Tratament	Jard.2
Natura produsului	PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii	06.10.2026
Anul exploatării	2026
Procedeul de inventariere	Fir cu fir
Ciocan rotund numărul	VN0919
Ciocan pătrat numărul	

Informații privind N.T.S.M.		
Stâncării pe		ha
Arbori putregăioși	0	buc
cu un volum de	0	mc
Iescării	0	buc
cu un volum de	0	mc

Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Răşinoase	150	2,22
FAG	210	3,19
Quercinee	0	0,00
Diverse tari	0	0,00
Diverse moi	0	0,00
Total	360	2,79

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	120,25	34,05	10,91	9,27	2,46	0	0,64	177,58	19,75	36,12	0,07	233,45
Molid	56,06	8,9	1,68	0,94	0,3	0	0,09	67,97	6,06	25,26	0	99,29
Fag	264,42	117,45	0	10,72	4,67	1,82	0,2	399,28	19,96	251,38	32,56	670,62
TOTAL	**440,73**	**160,40**	**12,59**	**20,93**	**7,43**	**1,82**	**0,93**	**644,83**	**45,77**	**312,76**	**32,63**	**1003,36**

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
050	12,91	186	29.00	62.00	8	5FA3BR2MO	1,1	1003,36
Total	**12,91**				**8**			**1003,36**

U.A.	BR	MO	FA	Total
050	233,45	99,29	670,62	**003,36**

U.A.	Specia	Diametre		Inaltimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
050	BR	38,87	38,66	26,88	26,88	186	1,95	120		120,25	34,05	10,91	9,27	2,46	0	0,64	177,58	19,75	36,12	0,07	233,45
050	MO	53,80	53,92	31,66	31,66	186	3,31	30		56,06	8,9	1,68	0,94	0,3	0	0,09	67,97	6,06	25,26	0	99,29
050	FA	49,78	49,31	27,92	27,92	186	3,19	210		264,42	117,45	0	10,72	4,67	1,82	0,2	399,28	19,96	251,38	32,56	670,62
Total U.A.								**360**	**0**	**440,7**	**160,4**	**12,59**	**20,93**	**7,43**	**1,82**	**0,93**	**644,8**	**45,77**	**312,7**	**32,63**	**1003,36**
Total general U.A.								**360**	**0**	**440,73**	**160,40**	**12,59**	**20,93**	**7,43**	**1,82**	**0,93**	**644,83**	**45,77**	**312,76**	**32,63**	**1003,36**

Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
PETREA VASILIU

Verificat,


Data tipăririi:

Resource Navigator v26.6.12.1

v1.0


SCHIȚA PARTIZII

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

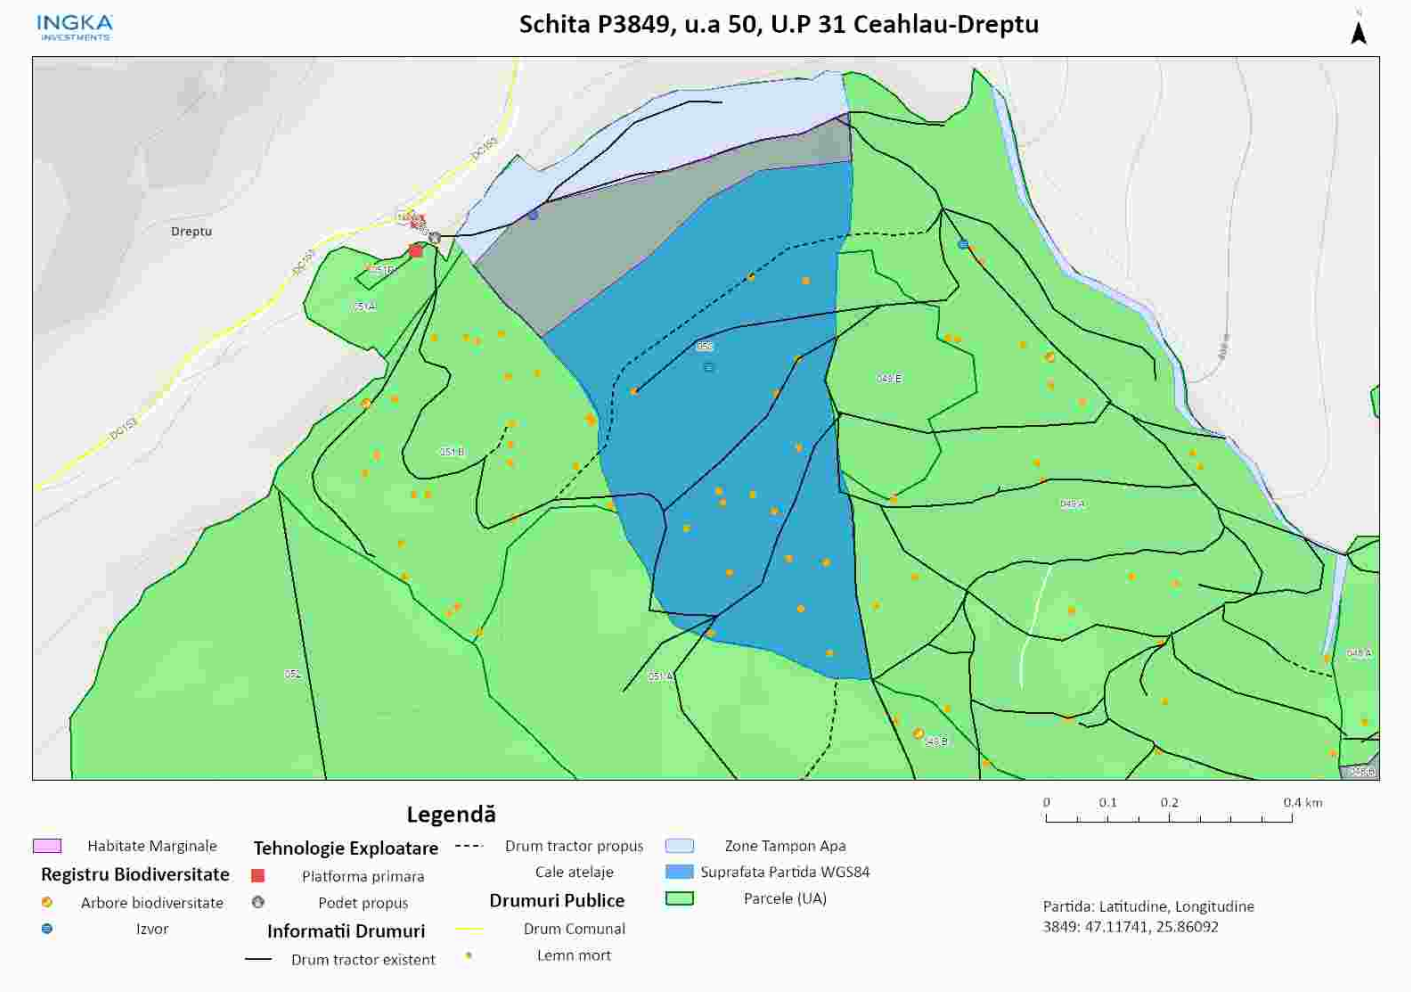

Întocmit: Ing. IONEL FURTUNA

SCHIȚA DE ANSAMBLU

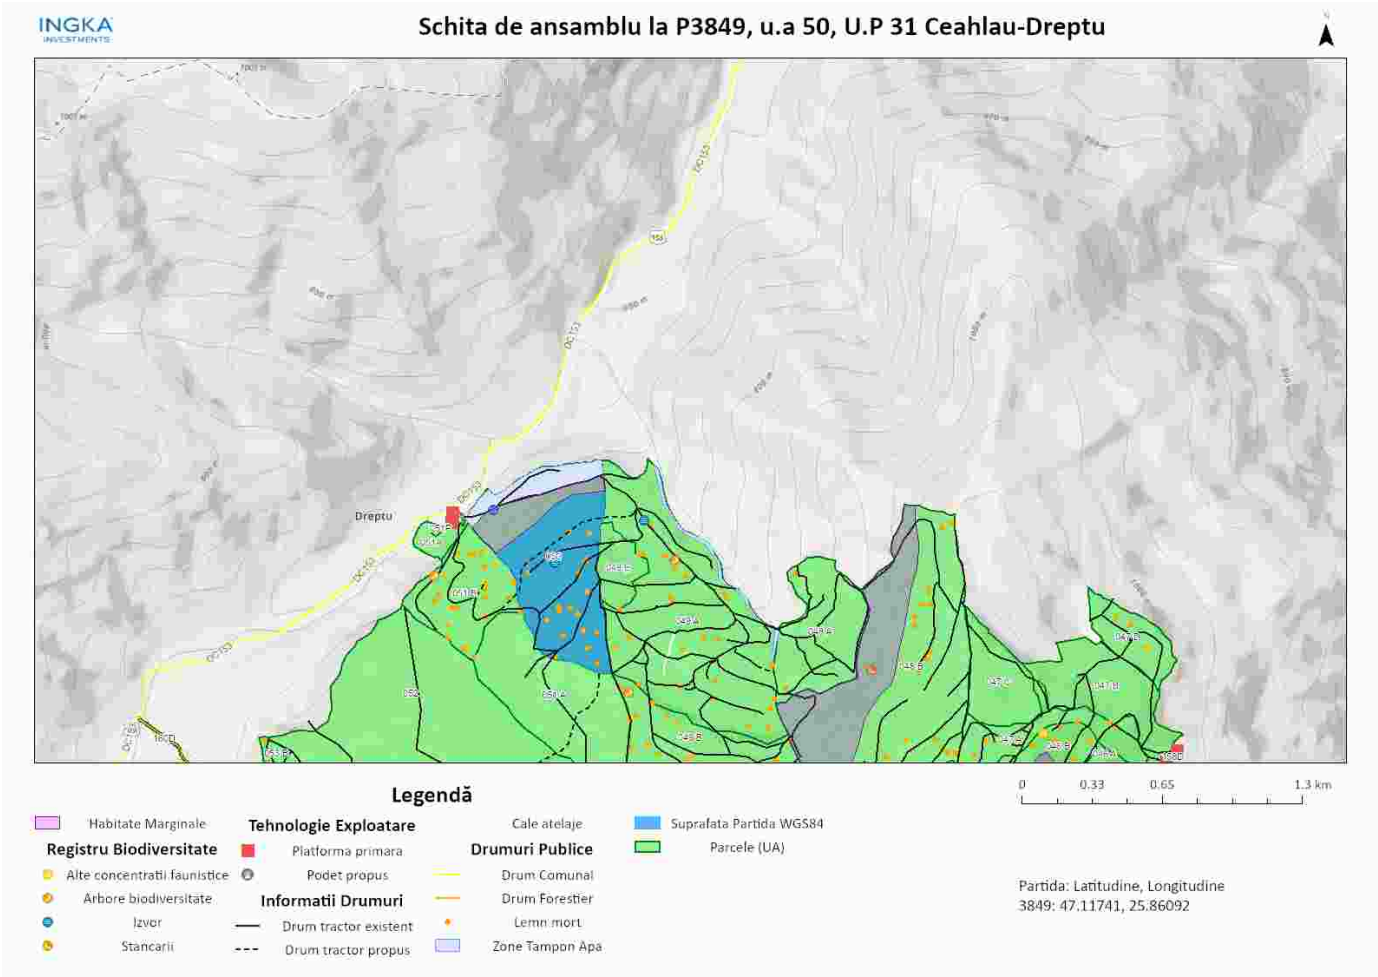

Întocmit: Ing. IONEL FURTUNA

Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

Anexă APV nr. 3849/2600125303060 P3849_UP31_ua50_Piciorul Cerbu

Localizare: U.P. XXXI Ceahlau - Dreptu u.a. 50

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăţi/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operaţiunilor:DA

- obiectiv: Platforma primara este in afara proprietatii ingka
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: Nu se vor abandona resturi de exploatare in platforma primara la finalizarea partizii. Se va respecta tehnologia de exploatare autorizata.
- proceduri de compensare a proprietarilor: Intelegere intre factorul afectat si beneficiarul masei lemnuase

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: pr. dreptu
- lungime sector afectat: 8
- lucrari hidrotehnice -
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: nu se va colecta material lemnus in perioadele cu precipitatii abundente precum si atunci cand solul este moale de la precipitatii sau dezghet.
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): linie verticala verde
- Suprafața zonei tampon 2.71 ha
- Volumul pe picior din zona tampon 1055 mc
- Podeţe de traversare(amplasament, detalii contrucţie): Podet din tuburi, temporar amplasate.Se va demonta imediat in perioadele cu alerte hidrologice (precipitatii abundente)
- Restricţionarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): In perioadele cand solul este moale si sunt precipitatii abundente
- Alte soluţii tehnice: Traversarea paraului Dreptu in perioada de iarna pe pod de gheata

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:DA

Măsuri Nu se vor dobora arbori inspre zona delimitata la izvor/izvoare; Nu se va colecta masa lemnoasa prin zona respectiva

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:DA

- obiectiv (denumire): captari apa potabila localnici
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: nu se vor dobora arbori spre bazine, nu se va colecta masa lemnuasa prin respectiva suprafata, nu se vor deversa apele pluviale catre acestea.
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: intelegere intre factorul afectat si beneficiarul masei lemnuase

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, păduri ripariene) :DA / Obiectiv Stancarii si grohotisuri naturale - 3,08 ha.

- Măsuri de conservare In aceasta zona nu se vor abandona resturi de exploatare, nu se va depozita material lemnos si nu se vor executa drumuri de tractor.

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:NU / Categoria VRC _____

- Măsuri de management _____

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale: NU
Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri de colectare cu potențial de eroziune: DA

- Măsuri de management: Pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua măsuri pentru evacuarea apelor în afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole (bolovani, fascine, gărdulețe, piese de lemn).

11. Pe suprafaţa parchetului s-a identificat și materializat:
(i) un număr de **_____** arbori pentru biodiversitate mentinuti pe suprafata parchetului, cu un volum total 0 mc
(ii) un număr de "insule de îmbătrânire" delimitate prin - (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

- Suprafața insule imbatranire 0 ha
- Volumul pe picior din insule de imbatranire 0 mc

(iii) un numar de 17 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 20.36 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricţii de rulare _____

- restricţii de tonaj(alte restrictii/observatii): _____ tronson drum: _____ orar: _____

13. Menţiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

_____

Soluții adoptate: Este necesar obtinerea acordului de trecere, depozitare, sortare si manipulare a masei lemnoase de catre beneficiarul masei lemnoase de la factorul afectat

Resp. marcare Ionel Furtuna Data: 27.10.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN
