Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3772_UP22_ua36%_Crasna, , Grad de accesibilitate: 1001 - 1500m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
20.08.2026	3772	26001253022 90	XXII Crasna	BUZAU - COVASNA - BIHOR	CRASNA	

Suprafața totală act.	11,40
Tratament	Rarituri
Natura produsului	SECUNDARE/LUCRARI INGRIJIRE
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii	07.08.2026
Anul exploatării	2026
Procedeul de inventariere	Fir cu fir
Ciocan rotund numărul	VN0909
Ciocan pătrat numărul	

Informații privind N.T.S.M.		
Stâncării pe	2	ha
Arbori putregăioși	0	buc
cu un volum de	0	mc
Iescării	0	buc
cu un volum de	0	mc

Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Rășinoase	1251	0,35
FAG	729	0,16
Quercinee	0	0,00
Diverse tari	24	0,19
Diverse moi	0	0,00
Total	2004	0,28

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	2,96	2,12	0,39	0,2	0,05	0	0,01	5,73	0,64	1,59	0	7,96
Molid	13,08	78,46	71,56	85,1	23,16	0	7,95	279,31	31,01	114,83	0,19	425,15
Fag	0	2,52	0	2,56	4,45	5,64	4,01	19,18	1,42	98,66	12,69	119,26
Mesteacan	0	0,04	0	0,07	0,09	0,1	0,04	0,34	0,08	2,22	0,12	2,64
Paltin de munte	0	0	0	0	0,1	0,12	0,04	0,26	0,04	1,61	0,19	1,91
TOTAL	**16,04**	**83,14**	**71,95**	**87,93**	**27,85**	**5,86**	**12,05**	**304,82**	**33,19**	**218,91**	**13,19**	**556,92**

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
036	11,40	70	30.00	0.00	0	0	0	556,92
Total	**11,40**				**0**			**556,92**

U.A.	BR	MO	FA	ME	PAM	Total
036	7,96	425,15	119,26	2,64	1,91	**556,92**

U.A.	Specia	Diametre		Inaltimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
036	BR	42,00	42,00	24,60	24,60	70	1,59	5		2,96	2,12	0,39	0,2	0,05	0	0,01	5,73	0,64	1,59	0	7,96
036	MO	21,70	22,26	16,70	16,70	70	0,34	1246		13,08	78,46	71,56	85,1	23,16	0	7,95	279,31	31,01	114,83	0,19	425,15
036	FA	15,84	16,77	14,32	14,32	70	0,16	729		0	2,52	0	2,56	4,45	5,64	4,01	19,18	1,42	98,66	12,69	119,26
036	ME	20,18	20,18	15,91	15,91	70	0,24	11		0	0,04	0	0,07	0,09	0,1	0,04	0,34	0,08	2,22	0,12	2,64
036	PAM	16,62	16,62	13,77	13,77	70	0,15	13		0	0	0	0	0,1	0,12	0,04	0,26	0,04	1,61	0,19	1,91
Total U.A.								**2004**	**0**	**16,04**	**83,14**	**71,95**	**87,93**	**27,85**	**5,86**	**12,05**	**304,82**	**33,19**	**218,91**	**13,19**	**556,92**
Total general U.A.								**2004**	**0**	**16,04**	**83,14**	**71,95**	**87,93**	**27,85**	**5,86**	**12,05**	**304,82**	**33,19**	**218,91**	**13,19**	**556,92**

Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
SILVIU TICU

Verificat,


Data tipăririi:

Resource Navigator v26.6.12.1

v1.0


SCHIȚA PARTIZII

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

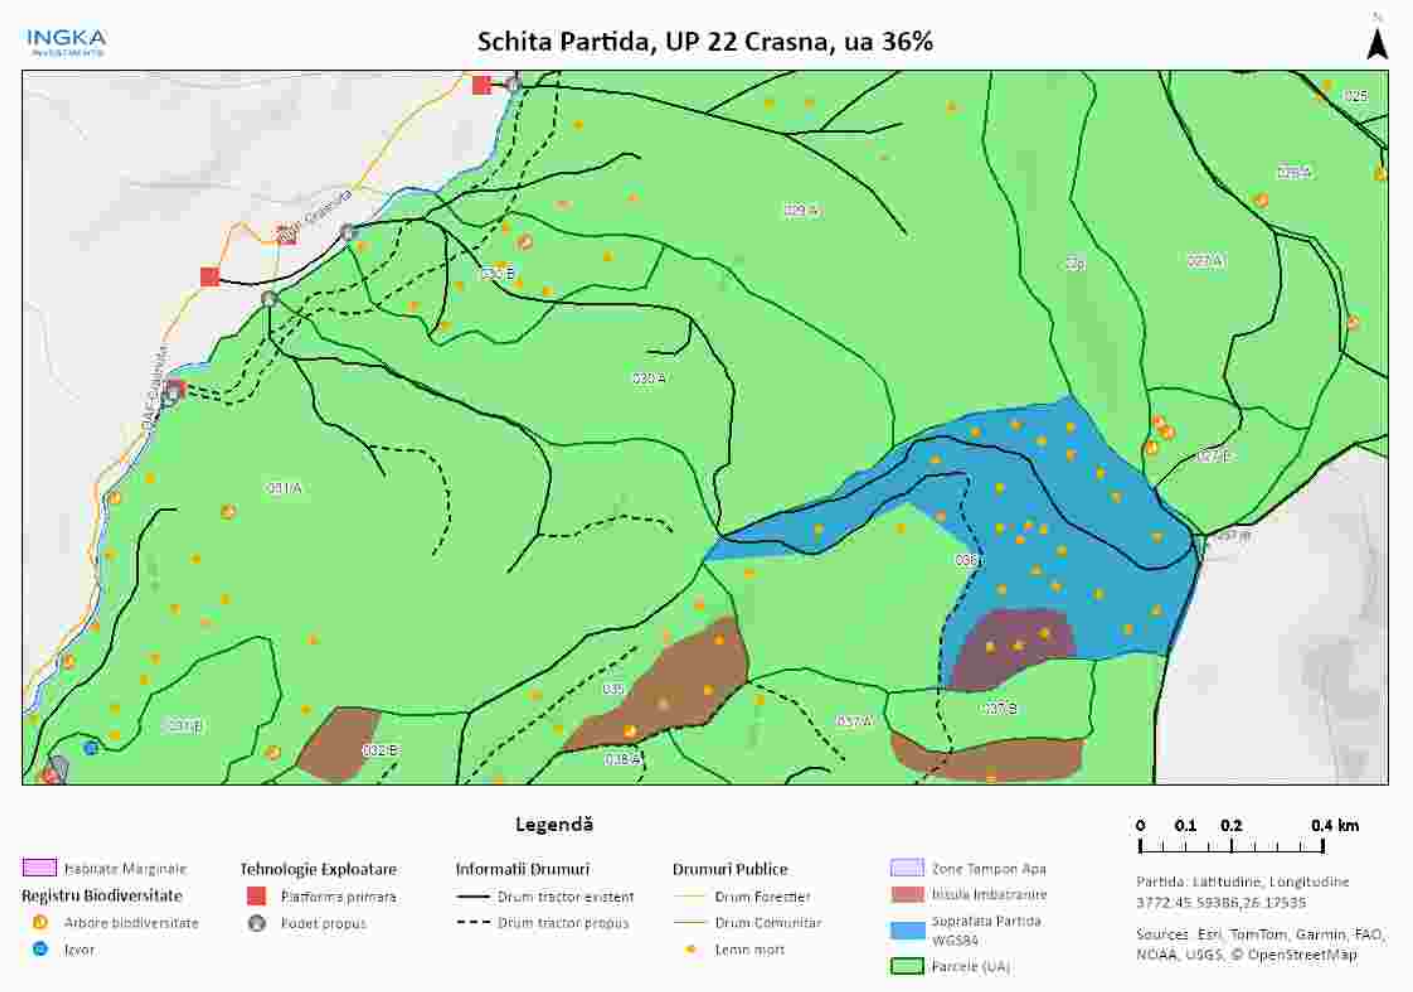

Întocmit: Ing. COSMIN BORCEA

SCHIȚA DE ANSAMBLU

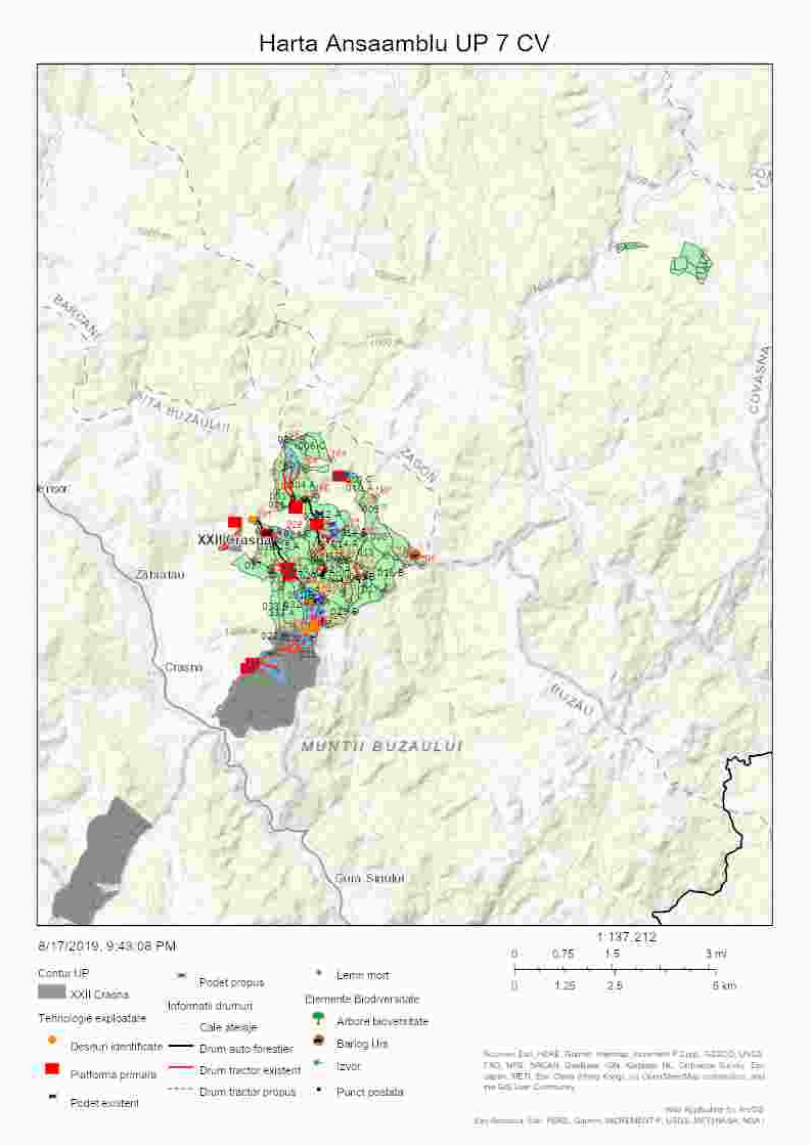

Întocmit: Ing. COSMIN BORCEA

Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

Anexă APV nr. 3772/2600125302290 P3772_UP22_ua36%_Crasna

Localizare: U.P. XXII Crasna u.a. 36

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăţi/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operaţiunilor:DA

- obiectiv: Terenul pentru platforma primara si parte a drumului de scos-apropiat.
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: Nu se va colecta masa lemnoasa in perioadele cand solul este moale. Se vor mentine in stare corespunzatoare drumurile si zona platformei primare. La finalizarea lucrarii acestea vor fi readuse la starea lor initiala.
- proceduri de compensare a proprietarilor: Intelegere intre proprietar si cumpartorul masei lemnoase.

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: paraul Crasnuta
- lungime sector afectat: 4
- lucrari hidrotehnice nu este cazul
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: respectarea drumurilor de tractor.
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): nu este cazul
- Suprafața zonei tampon 0 ha
- Volumul pe picior din zona tampon 0 mc
- Podeţe de traversare(amplasament, detalii contrucţie): 1 podet din tub.
- Restricţionarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): nu se va scoate masa lemnuasa in platforma primara, pe timp ploios.
- Alte soluţii tehnice: nu sunt necesare.

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:NU / Categoria VRC _____

- Măsuri de management _____

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale : NU

Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri **de colectare cu** potenţial **de eroziune: DA**

- Măsuri de management: Partida este amplasata în Situl Natura 2000-ROSCI 0190 - Penteleu. Se vor respecta condițiile specifice desfășurării activității de exploatareforestieră primite de la ANMAP Buzau

11. Pe suprafaţa parchetului s-a identificat și materializat:
(i) un număr de **_____** arbori pentru biodiversitate mentinuti pe suprafata parchetului, cu un volum total 0 mc
(ii) un număr de **1** "insule de îmbătrânire" delimitate prin spray verde (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

- Suprafața insule imbatranire 1.66 ha
- Volumul pe picior din insule de imbatranire 857.1 mc

(iii) un numar de 28 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 13.9 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricţii de rulare DA

- restricţii de tonaj(alte restrictii/observatii): Nu se va transporta pe timp ploios. tronson drum: Drumul auto forestier este administrat de os covasna. orar: nu este cazul.

13. Menţiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

Caile de colectare se vor mentine permanent curate.

Soluții adoptate: Este responsabilitatea cumparatorului de a identifica administratorul drumurilor care vor fi folosite pentru transportul materialului lemnos, respectiv de a-si onura obligatiile fata de acesta.

Resp. marcare Cosmin Borcea Data: 21.08.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN
