Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3832_UP3_ua 577A%_Cenaru, , Grad de accesibilitate: 501 - 1000m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
12.10.2026	3832	26001253028 90	III Valea Neagra - Motnau	SUSITA - MILCOV	MILCOV	

Suprafața totală act.	16,40
Tratament	Rarituri
Natura produsului	SECUNDARE/LUCRARI INGRIJIRE
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii	08.10.2026
Anul exploatării	2026
Procedeul de inventariere	Fir cu fir
Ciocan rotund numărul	VN0918
Ciocan pătrat numărul	

Informații privind N.T.S.M.		
Stâncării pe	2	ha
Arbori putregăioși	41	buc
cu un volum de	25,22	mc
Iescării	15	buc
cu un volum de	11,95	mc

Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Răşinoase	980	0,35
FAG	1636	0,08
Quercinee	0	0,00
Diverse tari	714	0,09
Diverse moi	43	0,32
Total	3373	0,16

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	17,57	64,21	34,48	44,52	15,5	0	5,23	181,51	20,35	129,25	0,86	331,11
Molid	0,05	0,73	0,79	1,59	0,57	0	0,22	3,95	0,47	5,22	0,02	9,64
Fag	0,1	3,04	0	1,8	3,35	5,29	7,38	20,96	1,63	106,92	15,76	129,51
Carpen	0	0	0	0	0,01	0,02	0,06	0,09	0,01	0,55	0,08	0,65
Cires	0	0,21	0	0,23	0,44	0,27	0,11	1,26	0,16	8,29	0,69	9,71
Paltin de munte	0	0,18	0	0,38	1,8	2,16	2,32	6,84	1,12	44,2	6,31	52,16
Ulm de munte	0	0,05	0	0,07	0,09	0,07	0,03	0,31	0,06	1,98	0,13	2,35
Anin alb	0	0,05	0	0,08	0,22	0,13	0,02	0,5	0,05	3,12	0,22	3,67
Plop tremurator	0	1,58	0	0,26	0,14	0,06	0,01	2,05	0,29	4,83	0,54	7,17
Salcie capreasca	0	0,02	0	0,1	0,11	0,09	0,07	0,39	0,08	2,41	0,21	2,88
TOTAL	**17,72**	**70,07**	**35,27**	**49,03**	**22,23**	**8,09**	**15,45**	**217,86**	**24,22**	**306,77**	**24,82**	**548,85**

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
577 A	16,40	45	22.00	0.00	0	0	0	548,85
Total	**16,40**				**0**			**548,85**

U.A.	BR	MO	FA	CA	CI	PAM	UL.M	AN	PLT	SAC	Total
577 A	331,11	9,64	129,51	0,65	9,71	52,16	2,35	3,67	7,17	2,88	**548,85**

U.A.	Specia	Diametre		Inaltimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
577 A	BR	20,82	20,61	14,10	14,10	45	0,36	913		17,57	64,21	34,48	44,52	15,5	0	5,23	181,51	20,35	129,25	0,86	331,11
577 A	MO	17,52	17,93	9,75	9,75	45	0,14	67		0,05	0,73	0,79	1,59	0,57	0	0,22	3,95	0,47	5,22	0,02	9,64
577 A	FA	11,96	11,94	9,96	9,96	45	0,08	1636		0,1	3,04	0	1,8	3,35	5,29	7,38	20,96	1,63	106,92	15,76	129,51
577 A	CA	11,10	11,48	8,07	8,07	45	0,01	49		0	0	0	0	0,01	0,02	0,06	0,09	0,01	0,55	0,08	0,65
577 A	CI	17,65	17,68	13,48	13,48	45	0,21	46		0	0,21	0	0,23	0,44	0,27	0,11	1,26	0,16	8,29	0,69	9,71
577 A	PAM	13,00	13,19	10,64	10,64	45	0,09	609		0	0,18	0	0,38	1,8	2,16	2,32	6,84	1,12	44,2	6,31	52,16
577 A	UL.M	19,00	19,00	12,50	12,50	45	0,24	10		0	0,05	0	0,07	0,09	0,07	0,03	0,31	0,06	1,98	0,13	2,35
577 A	AN	18,59	18,59	12,71	12,71	45	0,22	17		0	0,05	0	0,08	0,22	0,13	0,02	0,5	0,05	3,12	0,22	3,67
577 A	PLT	30,44	30,44	19,89	19,89	45	0,80	9		0	1,58	0	0,26	0,14	0,06	0,01	2,05	0,29	4,83	0,54	7,17
577 A	SAC	18,12	18,12	10,65	10,65	45	0,17	17		0	0,02	0	0,1	0,11	0,09	0,07	0,39	0,08	2,41	0,21	2,88
Total U.A.								**3373**	**0**	**17,72**	**70,07**	**35,27**	**49,03**	**22,23**	**8,09**	**15,45**	**217,8**	**24,22**	**306,7**	**24,82**	**548,85**
Total general U.A.								**3373**	**0**	**17,72**	**70,07**	**35,27**	**49,03**	**22,23**	**8,09**	**15,45**	**217,86**	**24,22**	**306,77**	**24,82**	**548,85**

Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
SIMONA STANILA

Verificat,


Data tipăririi:

Resource Navigator v26.6.12.1

v1.0


SCHIȚA PARTIZII

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

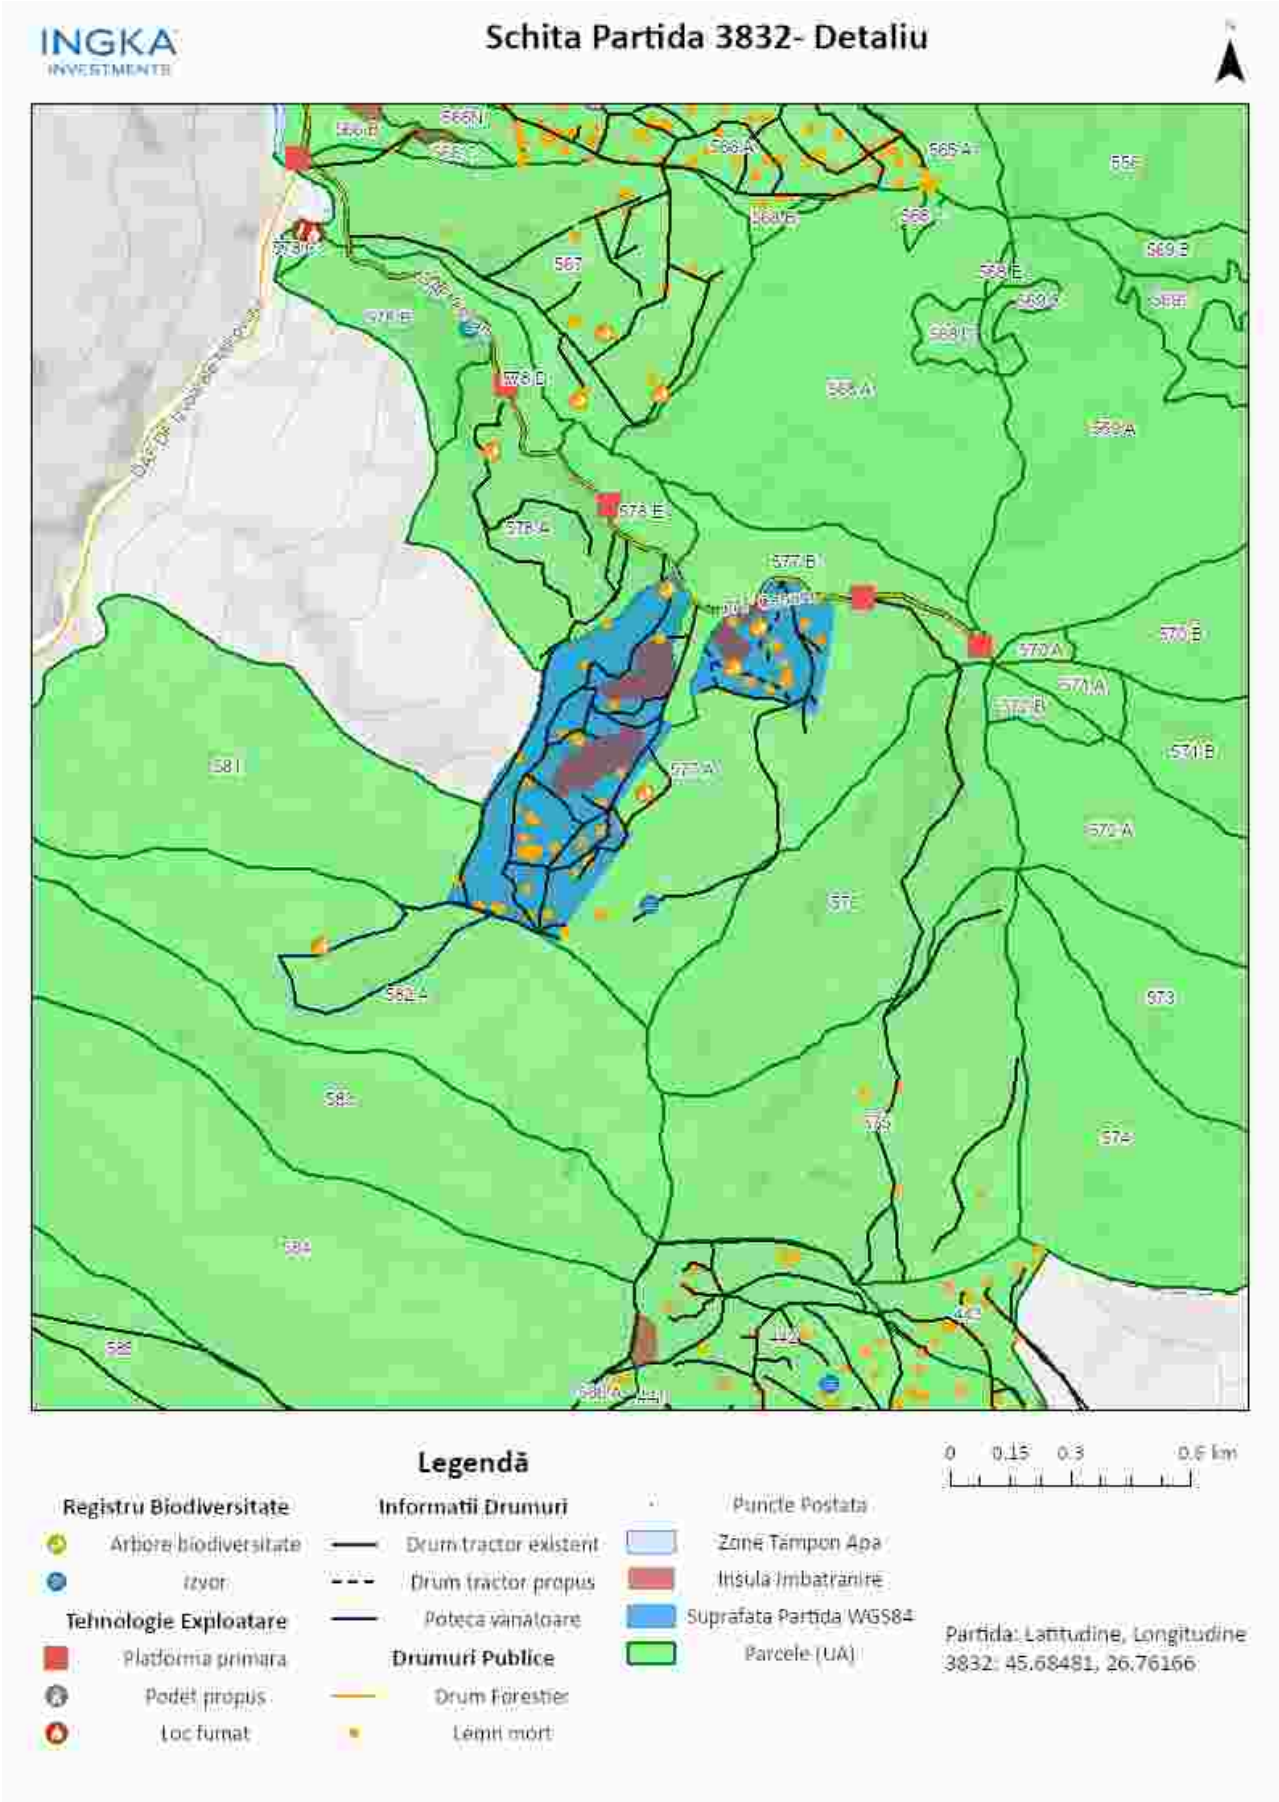

Întocmit: Ing. ALIN CHIVU

SCHIȚA DE ANSAMBLU

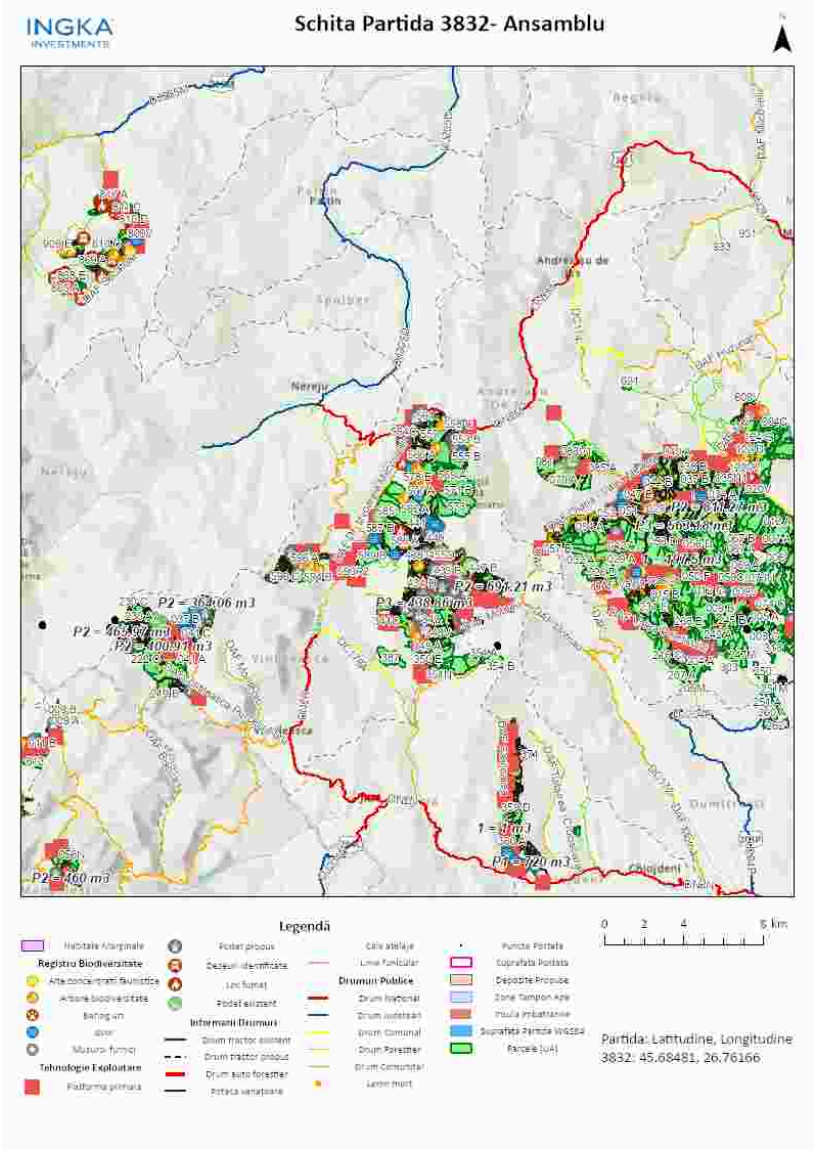

Întocmit: Ing. ALIN CHIVU

Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

Anexă APV nr. 3832/2600125302890 P3832_UP3_ua 577A%_Cenaru

Localizare: U.P. III Valea Neagra - Motnau u.a. 577 A

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăţi/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operaţiunilor:DA

- obiectiv: Paduri private
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: Utilizarea traseului de colectare si zonei de platforma primara existente/ convenite doar in afara perioadelor cand terenul este moale de la precipitatii sau dezghet. Directia de doborare a arborilor este in interiorul parchetului
- proceduri de compensare a proprietarilor: intelegere intre factorul afectat si beneficiarul masei lemnuase

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: NU

- Denumire pârâu: _____
- lungime sector afectat: _____
- lucrari hidrotehnice _____
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: _____
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): _____
- Suprafața zonei tampon _____ ha
- Volumul pe picior din zona tampon _____ mc
- Podeţe de traversare(amplasament, detalii contrucţie): _____
- Restricţionarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): _____
- Alte soluţii tehnice: _____

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:DA / Categoria VRC 4.2a

- Măsuri de management Colectarea masei lemnoase se va face prin ua 577B (VRC 4.2a) doar pe drumul de colectare trasat in teren si existent pe schita parchetului. Colectarea se va face doar cand terenul este tare, in afara perioadelor cu precipitatii sau ca urmare a deghetului.

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale: NU
Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri de colectare cu potențial de eroziune: DA

- Măsuri de management: Pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua măsuri pentru evacuarea apelor în afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole (bolovani, fascine, gărdulețe, piese de lemn).

11. Pe suprafaţa parchetului s-a identificat și materializat:
(i) un număr de **4** arbori pentru biodiversitate mentinuti pe suprafata parchetului, cu un volum total 2.18 mc
(ii) un număr de **3** "insule de îmbătrânire" delimitate prin cu vopsea verde si litetele ib (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);
- Suprafața insule imbatranire 2.375 ha
- Volumul pe picior din insule de imbatranire 553.304 mc

(iii) un numar de 50 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 24.21 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricţii de rulare DA

- restricţii de tonaj(alte restrictii/observatii): Restrictii de tonaj Butucoasa - 7,5 to tronson drum: Andreasu-Butucoasa orar: Permanent

13. Menţiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

Taxa de peiaj/pentru folosirea drumului catre OS Focsani. Ebulment si platforma rupta pe DAF Cenaru.

Soluții adoptate: Nu se va colecta material lemnos in parchet daca solul este imbibat cu apa de la precipitatii abundente sau dezghet

Resp. marcare Alin Chivu Data: 12.10.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN
